

Bauphase 2: Bauzeit ca. 14 - 16 Wochen















Zufahrt/Zugang zu den privaten Grundstücken muss immer gewährleistet sein

Zufahrt/Zugang zu den privaten Grundstücken muss immer gewährleistet sein

Baufeld Fahrleitung inkl. Gründung

Baufeld Fahrleitung inkl. Gründung

Gleis prov. mit Asphalt

- Legende**
-  Baufeld Leitungsbau
  -  Baufeld Gleisbau
  -  Baufeld Straßenbau
  -  Baufeld Hochbahnsteig
  -  Baufeld Ingenieurbauwerk
  -  Baufeld Trassenräumung
  -  fertiger Bauabschnitt
  -  MIV / Verkehrslenkung
  -  Stadtbahn
  -  geplante Stadtbahn
  -  Linienbusverkehr
  -  Rad- und Fußgänger
  -  prov. LSA
  -  prov. Markierung


**Baublauf Phase 2**  
 Tillystraße Nord bis Tillystraße Süd, Bauzeit ca. 14 bis 16 Wochen

Baurealisierung

- Vorbereitenden Maßnahmen für die Verkehrsführung auf der westlichen Seite. (Bordsteinanrampungen, Gründung der Rammrohre für die Fahrleitungsmasten etc.)
- Aufbruch Göttinger Chaussee und Herstellung der Gleisanlage Richtung stadteinwärts (Richtung Hannover). Zwischen neu herzustellenden Hochbahnsteig (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) und Gleis die Oberfläche provisorische herstellen. Endgültige Herstellung erfolgt nach Bau des Hochbahnsteiges.
- Neubau der Nebenanlage und der Fahrbahn.
- Herstellung provisorischer Fahrbahn mit Asphalt im Bereich des zukünftigen Grünleises.

Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung:

- Der MIV stadtein- und stadtauswärts wird über die westliche vorhandene Fahrbahn an der Baustelle vorbeigeleitet.
- Die Zufahrten zu den Anliegenden Grundstücken müssen immer gewährleistet sein.

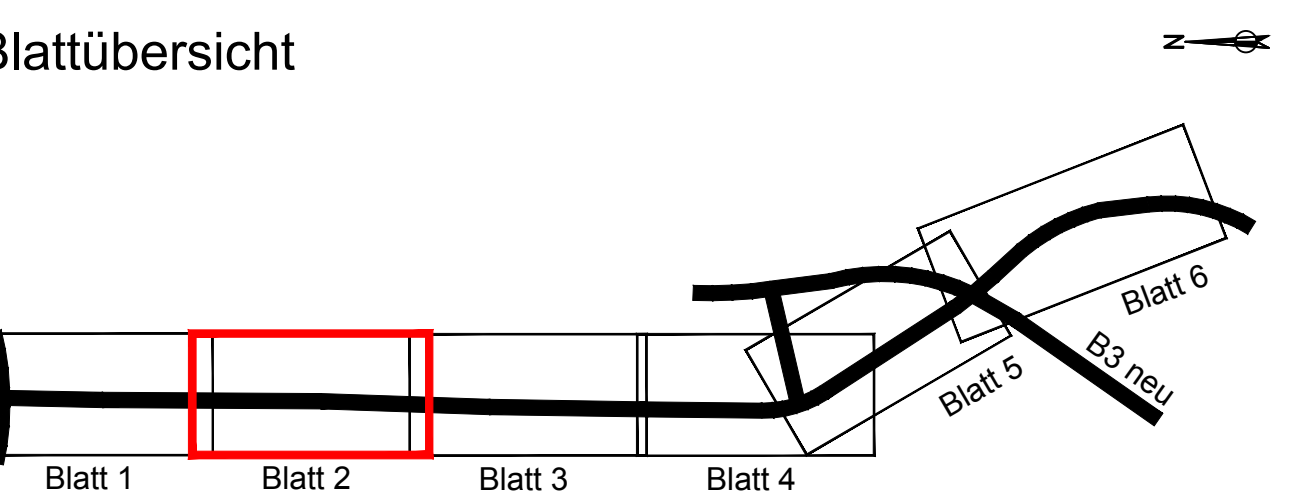

Art der Änderung/Ergrünzung		Datum	TransTecBau
Ph:	4655	Entwurfverfasser	
Bea:	Micha	06/2019	Hannover
Ge:	Hertmann	06/2019	
Soz:			
Zo:			
VA 3 BP 2_BA1			
Projekt:	Projektbesti	ÜSTRA	
Geseh:	Hannover	Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH	
Projekt:	1111.00	Vorhaben	infra
Blatt:		Hannover	
Anl.:	Blatt:	Stadtbahnstrecke A-Süd Göttinger Chaussee Stadtbahnverlängerung Hemmingen, PFA 1 Abschnitt Wallensteinstraße bis Saarstraße - Entwurfsplanung -	
Größe:	B: 59,4 cm L: 135 cm F: 0,80 m²		
Bauphasen:		M 1: 250	
Bauphasenplan 2 Bauabschnitt 1			

geplant am 24.06.2019 gespeichert unter: P:\VA065\_Göttinger Chaussee\2\_Bauphasenplanung\VA065\_VA3BP2\_BA1.dwg
